

株式会社 平山工業

平成 30年 1月度

平成 29年 1月 27日

安 全 衛 生 協 議 会

1. 安全教育

- ・重点行動目標の作成
- ・今月度のヒヤリハットを抽出して全員参加によるKY
- ・

2. 会社連絡事項

- ・ゴム手袋の支給について。
- ・通勤時の安全運転のお願い。
- ・
- ・

3. 社員からの要望

- ・特になし
- ・
- ・

4. 今月の重点行動目標

飛来・落下災害の防止

具体的な対策

- ・落ちそうな所に物を置かない(整理整頓)
- ・落下防止紐等を道具に取り付ける。
- ・落下防止ネットの設置状態の確認。
- ・マスク等の飛散養生の徹底。
- ・



写真NO.	1
タイトル	安全衛生協議会
場所	会議室
開催日	平成30年1月27日

備考:
参加者:16名



写真NO.	2
タイトル	安全衛生協議会
場所	会議室
開催日	平成30年1月27日

備考:
参加者:16名

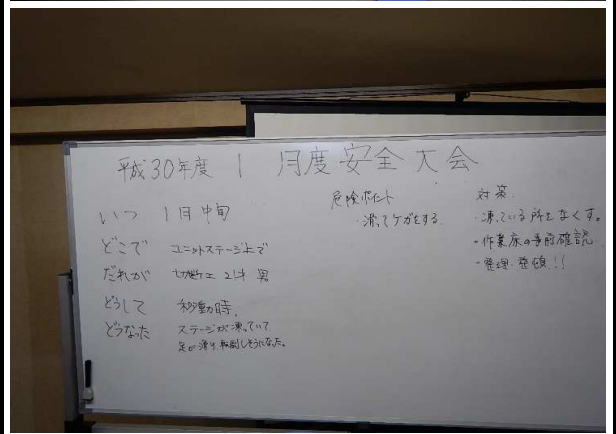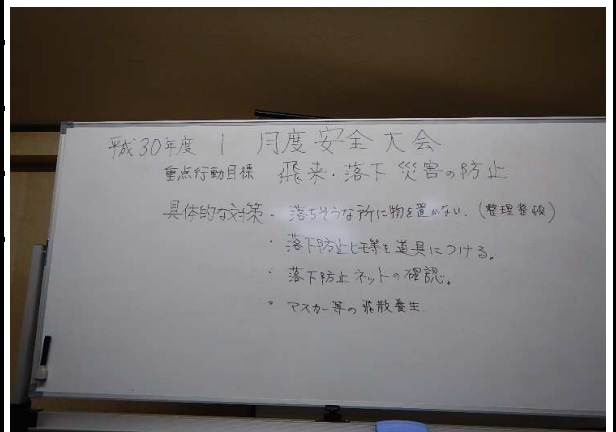

(株) 平山工業

平成 30年 1月度 ヒヤリ・ハット報告書まとめ

No.	報告者氏名	概要
1	増尾 友寿	足場作業でラチェットを使いボルトを外していた時手元が滑りラチェットを落とした。
2	武内 直行	足場上でコア削孔作業時頭上から道具が落下してきてあたりそうになった。
3	橋本 隆	現場ヤード内で工事用車両がぬかるみにハマリ自走で抜け出せなくなった。
4	比嘉 武	足場上移動時段差に躓き転倒しそうになった。
5	加藤 武志	現場への工事用車両での通勤時道路上に落下物がありぶつかりそうになった。
6	三木 博明	足場の昇降階段での昇降時階段が濡れていた為滑り転倒しそうになった。
7	長濱 浩好	削孔水の入っていたタンクを清掃中削孔水がはねて目に入りそうになった。
8	網野 温也	足場上でコア削孔作業時作業床においていた道具が足に当たり落としそうになった。
9	藤田 陽之	エポキシ樹脂攪拌時樹脂を手練りで攪拌したところ攪拌不良を起こしそうになった。
10	白井 真人	足場上コア削孔コアチューブを取替時に手を滑らしチューブを足場から落としかけた。
11	今川 一仁	足場作業でラチェットを使いボルトを外していた時手元が滑りラチェットを落とした。
12	田村 政也	重機解現場においてワイヤーソー作業時重機解体の振動で頭上のコンクリートが落下してきた。
13	築場 友哉	足場上での移動時頭上の単管に気付かず頭をぶつけてしまった。
14	坂田 武夫	ベニヤ板にドリルで穴開けている時ドリルのキリが靴にあたった。
15	岩本 一輝	足場上からコアガラを持って昇降階段を降りているとき滑って落下しそうになった。
16	居川 蓮也	削孔水運搬時足場が濡れていて滑り100Vの線に足が引っ掛かり転びそうになった。
17	河田 康平	ドリル削孔時ドリルが既設鉄筋に干渉、回されたドリルに巻き込まれそうになった。
18	徐 朋	コア削孔終了後墨間違いであることが分かり、穿け直しをさせられた。
19	姜 昆	ブラスト作業時ホースを移動させていると時足元の鉄骨に足をぶつけた。
20	趙 躍進	ドリル削孔時ドリルが既設鉄筋に干渉、回されたドリルに巻き込まれて手を怪我した。
21	孔 国	コア削孔道具運搬時に躓き転倒しそうになった。
22		
23		
24		
25		

(株) 平 山 工 業

平成30年 1月度 安全衛生協議会

開催日

平成30年1月27日

開催場所

会議室

出席者名簿

No.	氏 名	No.	氏 名
1	白井真人	17	橋本隆
2	如藤 武志	18	鎌倉 祐朝
3	坂田 武次	19	
4	今川 一介	20	
5	河田 康平	21	
6	網野 温也	22	
7	田村 政也	23	
8	武内 直行	24	
9	岩本 一輝	25	
10	比嘉 武		
11	姜 崑		
12	孔 国		
13	増尾 友寿		
14	徐 明		
15	平山 健二		
16	長 濱 浩子		
