

株式会社 平山工業

平成 29年 10月度

平成 29年 10月 25日

安 全 衛 生 協 議 会

1. 安全教育

- ・重点行動目標の作成
- ・今月度のヒヤリハットを抽出して全員参加によるKY
- ・車両移動時の注意事項の周知徹底
- ・橋梁コア削孔時のアンカー打設位置

2. 会社連絡事項

- ・車両事故の注意喚起(交通ルールの遵守)。
- ・コアの作業手順について
- ・寮の管理方法(カギの返却等)について
- ・今後の仕事の流れ

3. 社員からの要望

- ・特になし
- ・

5. 今月の重点行動目標

高所作業車の適正使用

具体的な対策

- ・バケット上の整理整頓・安全帯の完全使用
- ・障害物を事前に把握してからの操作
- ・作業場直下の立ち入り禁止措置
- ・設置箇所の確認

写真NO.	1
タイトル	安全衛生協議会
場所	会議室
開催日	平成29年10月25日

備考:


参加者:12名



写真NO.	2
タイトル	安全衛生協議会
場所	会議室
開催日	平成29年10月25日

備考:

参加者:12名

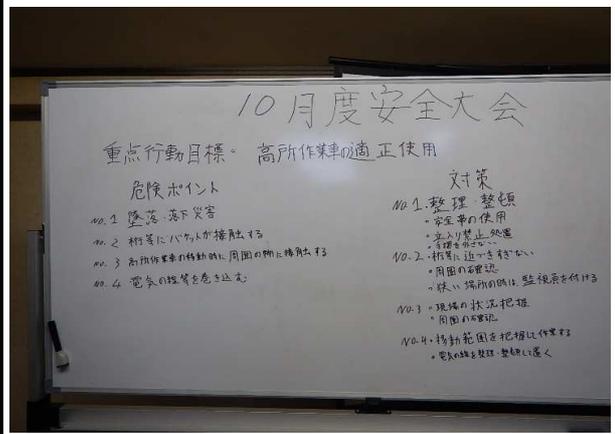

(株) 平山工業

平成 29年 10月度 ヒヤリ・ハット報告書まとめ

No.	報告者氏名	概要
1	増尾 友寿	高所作業車のステージを橋脚天端に移動させている時横桁に接触しそうになった。
2	武内 直行	橋梁沓座ハツリ時ガラが足場に落下して隙間から直下に落下してしまった。
3	橋本 隆	高所作業車のステージ上で移動する際配線に躓き転倒しそうになった。
4	比嘉 武	現場内で2 tトラックをバックで移動中現場内の駐車車両に接触した。
5	加藤 武志	橋梁沓座ハツリ時ガラが足場に落下して足場がへこんだ。
6	三木 博明	エポキシ樹脂注入作業で樹脂攪拌をしている時作業床のすき間で足を踏み外しそうになった。
7	長濱 浩好	橋脚天端狭小部でのコア削孔時回転部に手を巻き込まれしそうになった。
8	網野 温也	作業場へ足場階段で昇降時躓いてこけしそうになった。
9	藤田 陽之	立ち馬を清掃中立ち馬上のガラス管で指を切った。
10	白井 真人	高所作業車のステージを橋脚天端に移動させている時横桁に接触してしまった。
11	今川 一仁	アンカー筋をアンカー孔に挿入していた時ブラケットが落ちてきて当たりしそうになった。
12	田村 政也	脚立足場上でグラウト工事のポンプ圧入作業をしていた時足場のバランスが崩れ落ちしそうになった。
13	徐 朋	高所作業車のステージ上で移動する際配線に躓き転倒しそうになった。
14	坂田 武夫	橋梁ボックス桁内移動時躓いて転びしそうになった。
15	岩本 一輝	足場上でケミカルアンカーの攪拌をしていた時足場上に置いていた単管を落としそうになった。
16	居川 蓮也	削孔水をバケツ運搬時首の高さにあったフランジに当たりしそうになった。
17	河田 康平	足場上コア削孔時手元が滑りレンチを直下に落としてしまった。
18	孔 国	高所作業車のステージ上で移動する際配線に躓き転倒しそうになった。
19	姜 昆	夜間規制作業で規制の横を走っていた自転車にぶつかりしそうになった。
20	趙 躍進	グラウト工事で練り場でグラウト攪拌している際に保護マスクをせずに作業をし粉を吸い込んでしまった。
21		
22		
23		
24		
25		

(株) 平 山 工 業

平成29年 10月度 安全衛生協議会

開催日

平成29年10月25日

開催場所

会議室

出席者名簿

No.	氏 名	No.	氏 名
1	白井真人	17	
2	平山健二	18	
3	橋本 隆	19	
4	三木 博明	20	
5	田村 政也	21	
6	武内 道行	22	
7	姜 晶	23	
8	石 園	24	
9	篠 朋	25	
10	増尾 友寿		
11	鎌倉 祐輔		
12	平山 武夫		
13			
14			
15			
16			
